




Usedda

Union des Secteurs d'Énergie du Département de l'Aisne

**Point d'étape du déploiement
du FTTH
au 30 juin 2018**

Projet Très Haut Débit

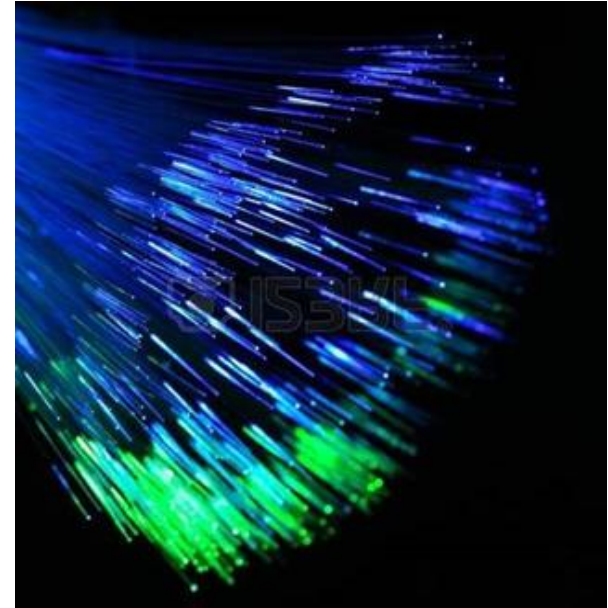

Projet Très Haut Débit


- **Zones Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement :**

- **Dans l'Aisne, 3 zones AMII déployées par Orange :**

1. La communauté d'agglomération de SAINT-QUENTIN
2. La communauté d'agglomération du PAYS DE LAON
3. La ville de SOISSONS

- **Soit 59 communes représentant 26% des habitants du département de l'Aisne.**

- **Zone d'initiative publique :
757 communes soit 200 000 prises**

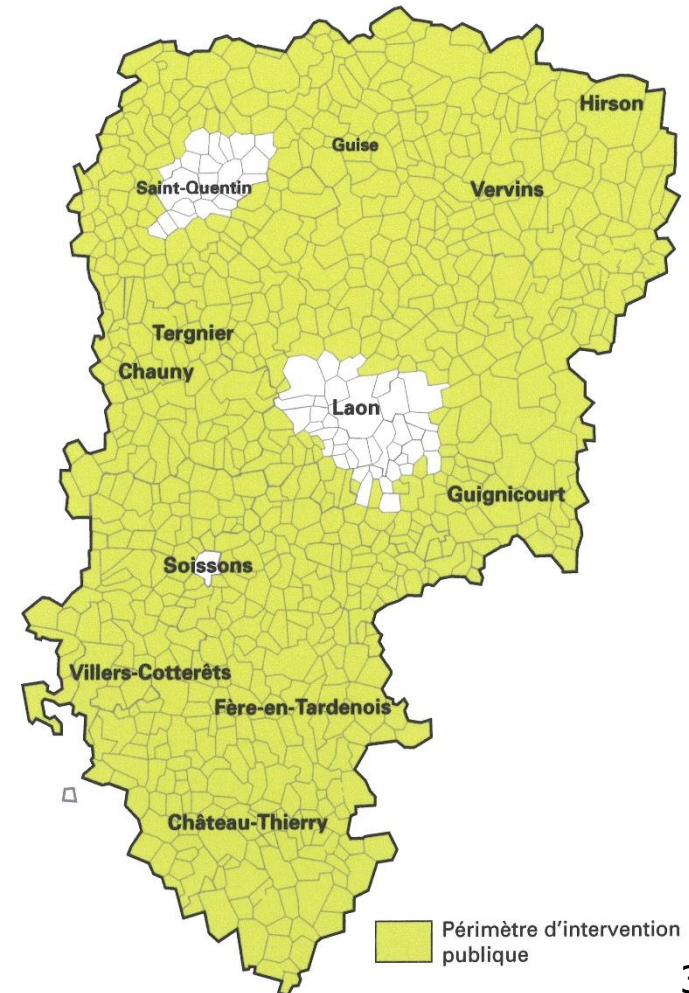



Une gouvernance à l'échelle départementale

- **Projet THD initialement lancé par le Conseil Général de l'Aisne, suite au refus des opérateurs privés d'investir pour un réseau fibre optique en zone rurale en absence de rentabilité.**
- **Depuis le 11 mars 2014, l'USEDA est le porteur unique du projet THD départemental en étroite partenariat avec le Conseil départemental.**




Financement

- **Accélération du planning de déploiement**
 - **Décembre 2020, 163 000 prises FTTH de réalisées**
 - **Au plus tard Décembre 2022, 200 000 prises**
- **Le financement de la 1^{er} tranche 2015-2020 est finalisé (200 millions € HT)**
 - **Europe : 11 millions d'Euros**
 - **Etat (Fonds National pour la Société numérique) : 51,6 millions d'Euros**
 - **Région : 6,7 millions d'Euros**
 - **Département : 22,5 millions d'Euros**
 - **Aisne THD : 28,5 millions d'Euros**
 - **Participation USEDA et membres : 79,7 millions d'Euros**

Au 1^{er} trimestre 2018, l'USEDA est au 3^e rang dans le top 20, pour le déploiement des lignes FTTH mises en service pour les zones d'initiatives publique.

Top 20 des lignes FttH mises en service sur les RIP au 1er trimestre 2018

Source ARCEP - Analyse Tactis

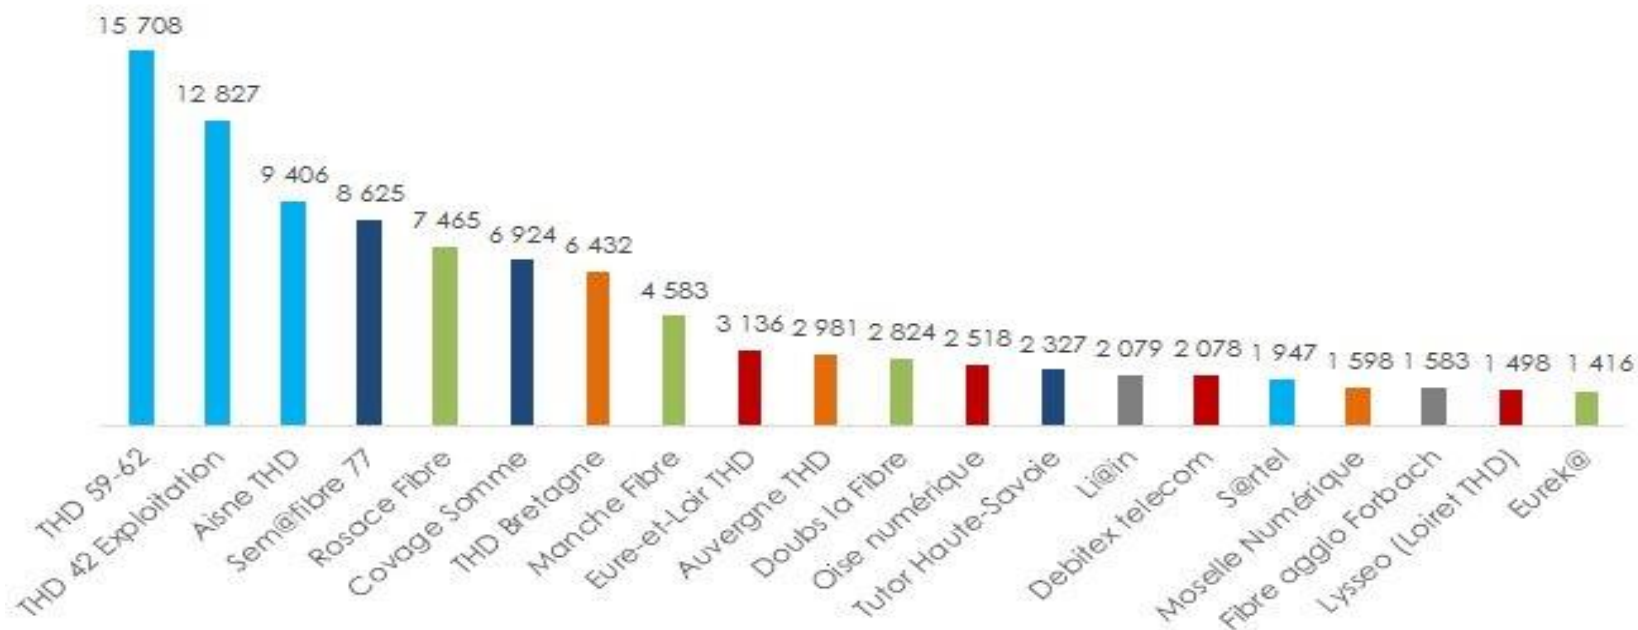





Point d'avancement de la Tranche 1

Rappel objectif 163 000 prises de déployées au 31 décembre 2020

	Nombre de prises au 25/06/2018	% réalisation tranche 1	Evolution par rapport au mois précédent
<i>Prises en études</i>	155 696	95,52%	0,20%
<i>Prises en travaux</i>	130 978	80,35%	2,97%
<i>Prises déployées</i>	84 552	51,87%	3,75%
<i>Prises publiées</i>	71 158	43,66%	2,29%
<i>Prises commercialisables</i>	56 434	34,62%	9,41%

Point d'avancement de la Tranche 1

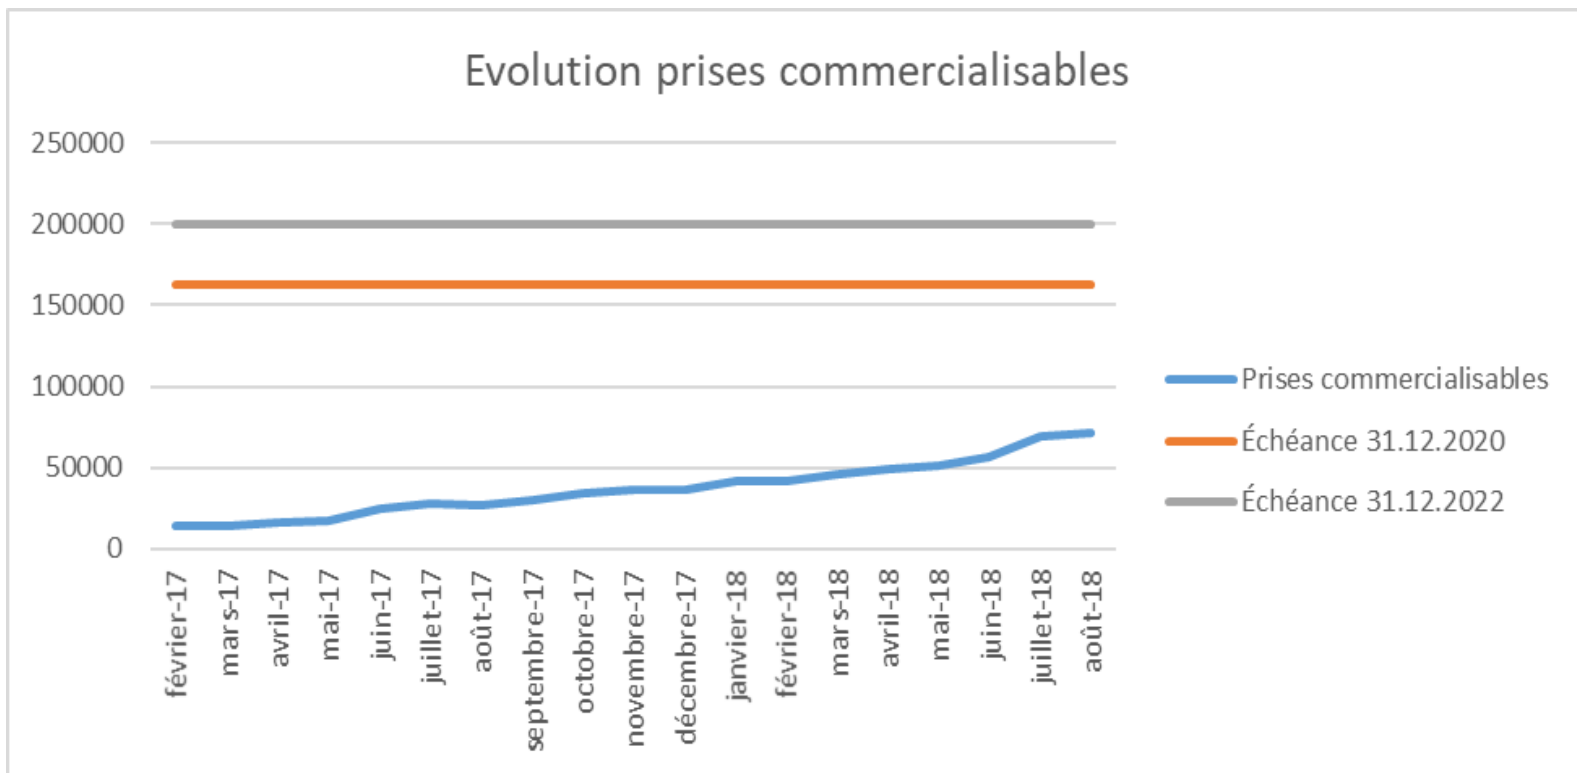

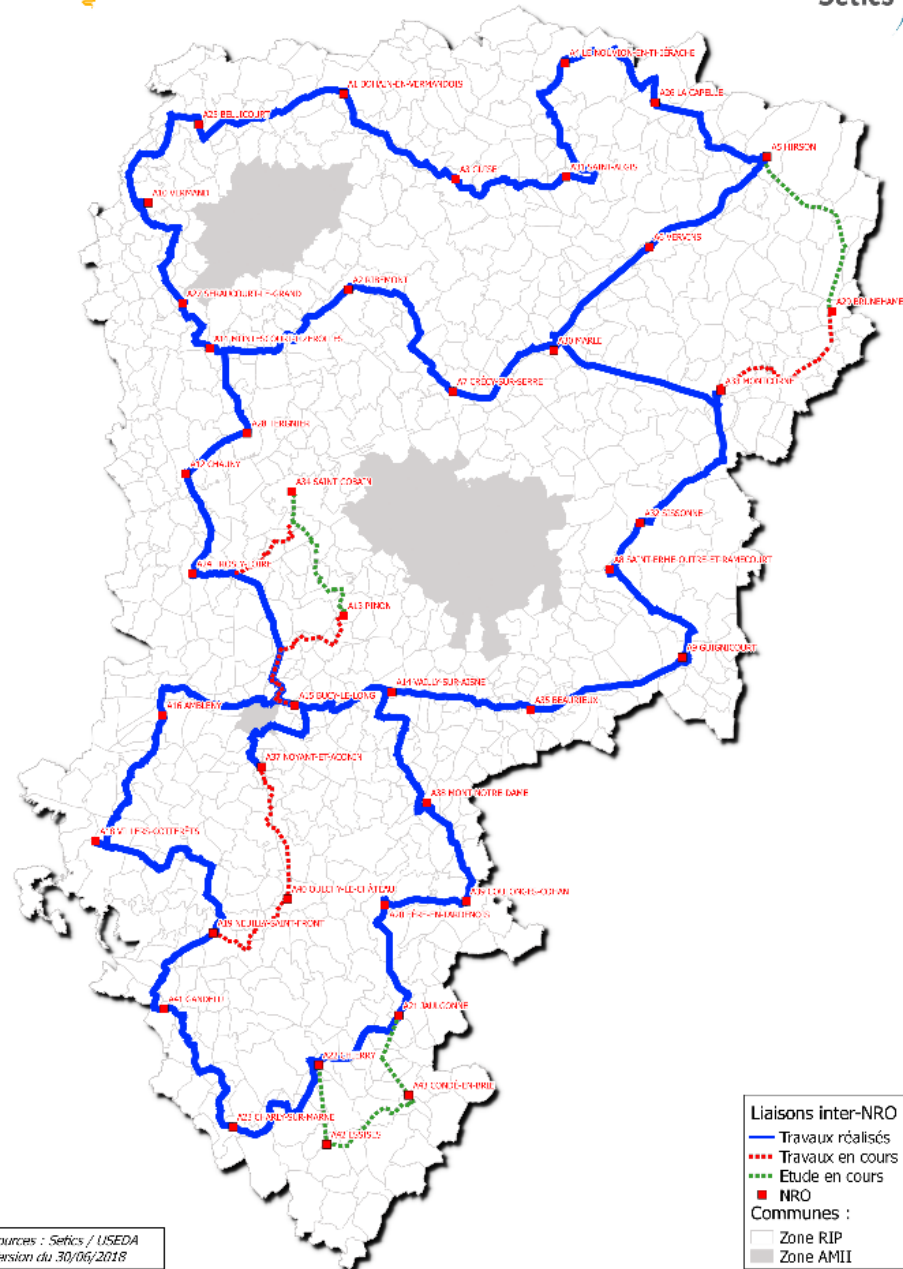


Sources : Setics / USEDA
 Version du 30/06/2018

Etat d'avancement au 31/03/2017


Etat d'avancement au 25/06/2018



Evolution de la couverture FTTH

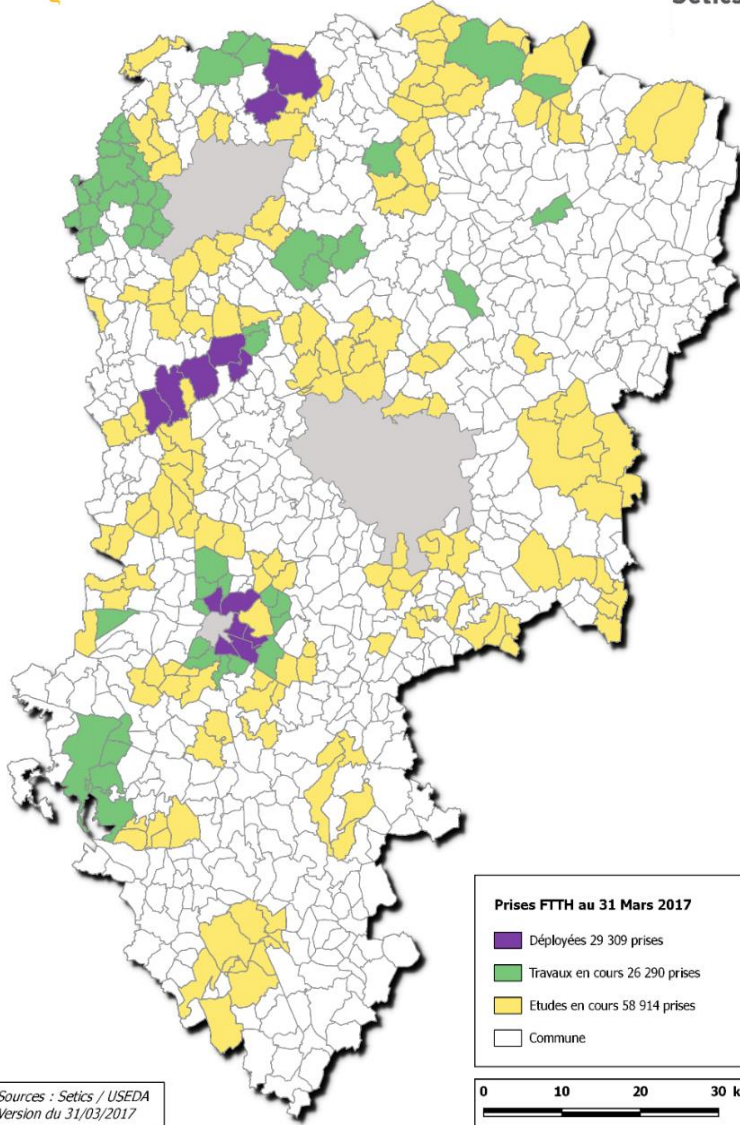


Evolution de la couverture FTTH

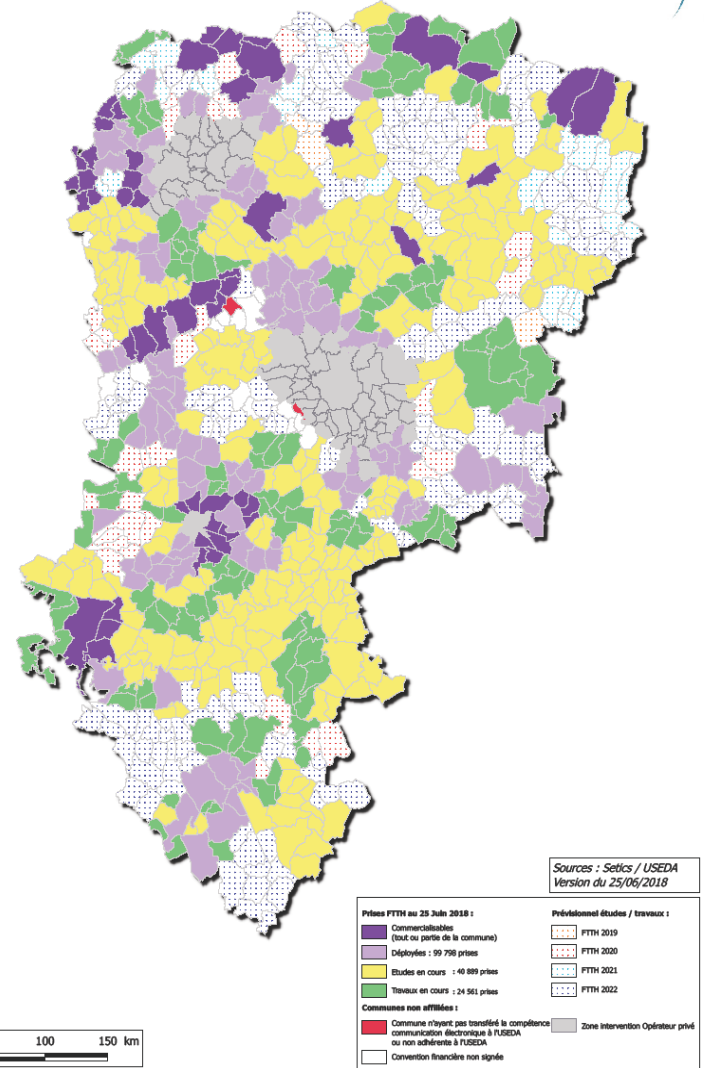



Evolution de la couverture FTTH

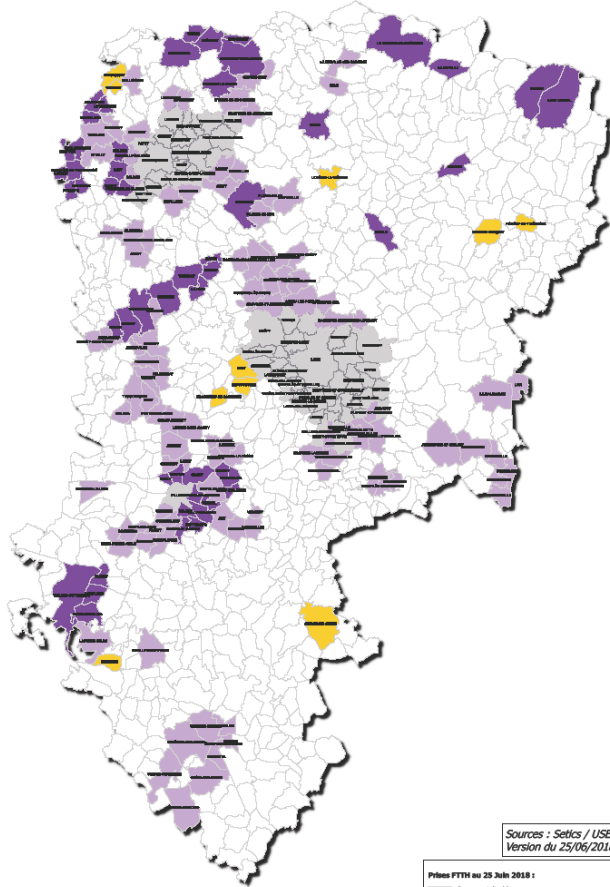

Sources : Setics / USED'A
Version du 25/06/2018


- Prises FTTH au 25 Juin 2018 :
- Commercialisables (tout ou partie de la commune)
 - Déployées : 99 796 prises
 - Montée en débit effective
 - Zone d'Appel à Manifestation d'Intérêt d'Investissement



Montée en débit



Etat d'avancement de la Montée en Débit

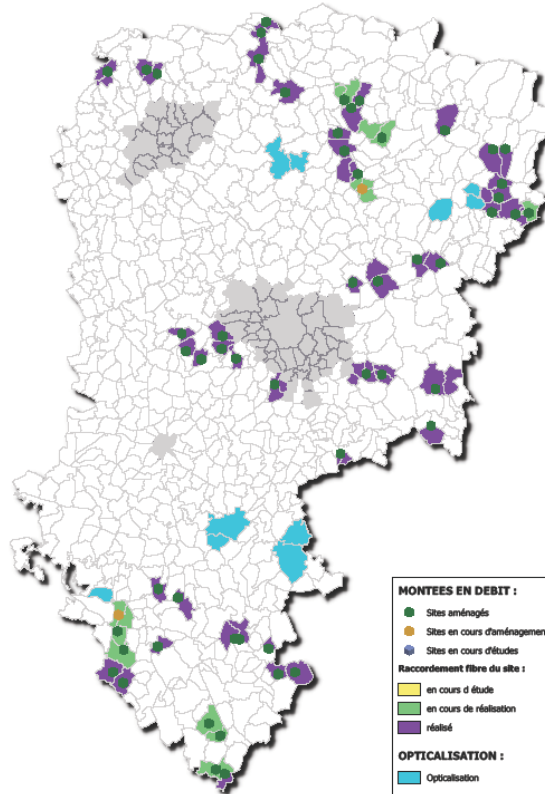

Sources : Setics / USEDA
Version du 25/06/2018

0 10 20 km



Montée en débit

Etat d'avancement du déploiement			
PRM en travaux	PRM réceptionnés par ORANGE	PRM en service au 31 juillet 2018	Total
16	20	21	57

Débit maximum estimé ADSL 20 Méga
Débit fourni par les opérateurs autour de 15 Méga




Commercialisation

- **Le réseau public RAISO est accessible à tous les Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) qui le souhaitent, du plus petit opérateur au plus grand.**
- **Cinq opérateurs présents sur le réseau sur la totalité du « RAISO »:**
 - **KNET**
 - **NORDNET**
 - **OZONE**
 - **VITIS**
 - **CORIOLIS**
- **Arrivée progressive et cadencée de BOUYGUES TELECOM à partir du 05 mars 2018 Pour en savoir plus :**
<https://www.bouyguestelecom.fr>



Commercialisation

Situation au 25 juin 2018			
Année	Prévision commercialisation	Prises réellement commercialisées	Taux de réalisation
2016	0		
2017	347	379	109,22%
2018	4682	2014	43,02%



Useda

Union des Secteurs d'Énergie du Département de l'Aisne



Merci de votre attention

Tél : 03 23 27 15 80

Site USEDA : <http://www.useda.fr>
